




## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DEL EF 2020



<b>Programa</b>	Unidad de Infraestructura Civil		
<b>Meta del PDOT</b>	Alcanzar al menos 6 m2/habitante de espacios sociales y recreativos al 2019 Al 2019 se implementa el 100% del parque lineal en el cantón Pedro Moncayo Al 2019 se implementan y mejoran 4 centros de desarrollo comunitario en el cantón Pedro Moncayo Al 2019 se mejora 10 CIBV's de la parroquia de Tabacundo		
<b>Programa del POA</b>	Saneamiento Ambiental		
<b>Descripción del Programa</b>	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento.		Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias.  Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual

Seguimiento				Ejecución				
Para avance programático				Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
Detalle	Medio de verificación		Pond. %					
1	Diseño del proyectos y TDR's de las obras de saneamiento ambiental del cantón Pedro Moncayo.		10,00	Unidad	1			
2	Construcción de la Planta de Tratamiento de aguas servidas del centro urbano de la parroquia de Tupigachi		17,00	Porcentaje	100	0		
3	Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza		17,00	Porcentaje	100	60	x	31/12/2020
4	Contratación del Servicio de Fiscalización de la Obra de Construcción Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza		17,00	Porcentaje	100	60	x	31/12/2020
5	Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal.		17,00	Porcentaje	100	70	x	31/12/2020
6	Contratación del Servicio de Fiscalización de la Obra de Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal.		17,00	Porcentaje	100	60	x	31/12/2020
7	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIIP		5,00	Unidad	12	12	x	31/12/2020
<b>Avance financiero</b>				<b>Codificado</b>				
				Inicial		Reforma		Ejecutado
GAD MPM				\$ 2.530.019,56		2.331.019,56		1.215.203,84

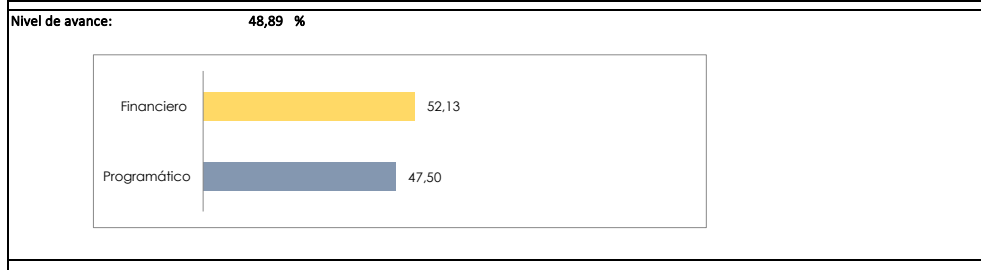

Mes	Programático	Financiero
Enero	4,23	313.354,50
Febrero	17,00	339.467,37
Marzo	18,15	-
Abril	18,54	-
Mayo	18,92	-
Junio	19,31	-
Julio	23,09	123.067,38
Agosto	30,53	-
Septiembre	30,95	-
Octubre	38,17	160.797,30
Noviembre	45,38	-
Diciembre	47,50	278.517,29

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2020:	<p><b>Avances:</b> Se encuentra en un avance del 12% Obra de la Contratación de la Obra para la Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, Un avance del 12% de construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, Un avance del 12% de la construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal, Un avance del 12% del proceso de construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal</p> <p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica</p>	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	31/01/2020
Febrero, 2020:	<p><b>Avances:</b> Se encuentra en un avance del 25% Obra de la Contratación de la Obra para la Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, Un avance del 25% de construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, Un avance del 25% de la construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal, Un avance del 25% del proceso de construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal</p> <p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica</p>	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	29/02/2020
Marzo, 2020:	<p><b>Avances:</b> No hay avances de obras por estado de emergencia</p> <p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Se hizo la paralización de todas las obras en ejecución del Canton de pedro moncayo por estado de Emergencia hasta nueva Orden del COE Cantonal.</p>	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	31/03/2020
Abril, 2020:	<p><b>Avances:</b> No hay avances de obras por estado de emergencia</p> <p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Se hizo la paralización de todas las obras en ejecución del Canton de pedro moncayo por estado de Emergencia hasta nueva Orden del COE Cantonal.</p>	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	30/04/2020
Abril, 2020:	<p><b>Avances:</b> No hay avances de obras por estado de emergencia</p> <p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Se hizo la paralización de todas las obras en ejecución del Canton de pedro moncayo por estado de Emergencia hasta nueva Orden del COE Cantonal.</p>	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	30/05/2020
Junio, 2020:	<p><b>Avances:</b> No hay avances de obra</p>	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	30/06/2020

	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		
Julio, 2020:	<u>Avances</u> Se encuentra en un avance del 25% Obra de la Contratación de la Obra para la Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, Un avance del 30% de construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, Un avance del 30% de la construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal, Un avance del 30% del proceso de construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal	Arq. William Tupiza Analista de infraestructura civil	31/07/2020
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Por estado de emergencia las obras se están reiniciando poco a poco en todos los frentes, hay un inconveniente en pago de las planillas atrasadas a los contratistas.		
Agosto, 2020:	<u>Avances</u> Se encuentra en un avance del 40% Obra de la Contratación de la Obra para la Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, Un avance del 40% de construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, Un avance del 40% de la construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal,	Arq. William Tupiza Analista de infraestructura civil	31/08/2020
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Por estado de emergencia las obras se están reiniciando poco a poco en todos los frentes, hay un inconveniente en pago de las planillas atrasadas a los contratistas.		
Septiembre, 2020:	<u>Avances</u> No hay avances de obra	Arq. William Tupiza Analista de infraestructura civil	30/09/2020
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		
Octubre, 2020:	<u>Avances:</u> Se encuentra en un avance del 50% Obra de la Contratación de la Obra para la Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, Un avance del 50% Contratación del Servicio de Fiscalización de la Obra de Construcción Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza	Arq. William Tupiza Analista de infraestructura civil	31/10/2020
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		
Noviembre, 2020:	<u>Avances:</u> Se encuentra en un avance del 60% Obra de la Contratación de la Obra para la Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, Un avance del 60% Contratación del Servicio de Fiscalización de la Obra de Construcción Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza Un avance del 60% de la construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal, Un avance del 60% Contratación del Servicio de Fiscalización de la Obra de Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal.	Arq. William Tupiza Analista de infraestructura civil	30/11/2020
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		
Diciembre, 2020:	<u>Avances:</u> Se encuentra en un avance del 60% Obra de la Contratación de la Obra para la Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, Un avance del 60% Contratación del Servicio de Fiscalización de la Obra de Construcción Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza	Arq. William Tupiza Analista de infraestructura civil	31/12/2020
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		
