



INFORME No. 022-DGOP-GADMPPM-AL-2025
Tabacundo, 28 de abril de 2025

Ing.
Luis Lema Msc
DIRECTOR DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Presente.

Asunto: **INFORME SOBRE EL ESTADO Y ARMADO DE LA ESTRUCTURA DE
CANANVALLE**

ANTECEDENTES

Mediante Memorando Nro. 613-DGOP-GADMPPM-2025, con fecha 25 de abril de 2025, suscrito por el Ing. Luis Lema Yaranga, en calidad de Director de Gestión de Obras Públicas, en el cual solicita *“...emitir un informe técnico con el detalle del estado y armado de la estructura de Cananvalle (losa para el 2do piso de la casa comunal), para lo cual deberán coordinar con el Ing. Darío Perugachi e Ing. Patricio Díaz Fiscalizador de la obra y demás participantes desarrolladores del proyecto en mención, información que se debe ser presentada hasta el día lunes 28 de abril de 2025 ...”*

INFORME

Con este antecedente se realizó la inspección, con fecha de 28 de abril de 2025, a las instalaciones donde se encuentra realizando esta obra para Cananvalle, La inspección se realizó en conjunto con el Ing. Patricio Díaz, Ing. Victor Muñoz y el Ing. Darío Perugachi en donde evidencio como van avanzado los trabajos en el armado del acero estructural.

Los trabajos que se encuentran realizados hasta el momento son los siguientes:

- Trabajos de imprimación de pintura en perfiles metálicos.
- Colocación a nivel de columnas metálicas.
- Corte y soldadura de vigas, según la especificación de los planos.

Los próximos trabajos a efectuarse es el montaje de vigas en la estructura, según lo estipulado por los dos trabajadores que se encuentran en este momento realizando el trabajo de corte y soldadura de vigas.

Al momento de efectuar el montaje de las vigas es de suma importancia el apoyo técnico del Ing. Darío Perugachi, al ser el diseñador estructural de esta obra sabe a qué nivel se deben colocar las vigas y demás aspectos técnicos.

Tabacundo, Calle Sucre 981
Parque Central

(02) 3836560

www.pedromoncayo.gob.ec





**pm PEDRO
MONCAYO**
Cuna del Pueblo Cochasquí
ALCALDÍA 2023 - 2027

MEMORIA FOTOGRÁFICA:

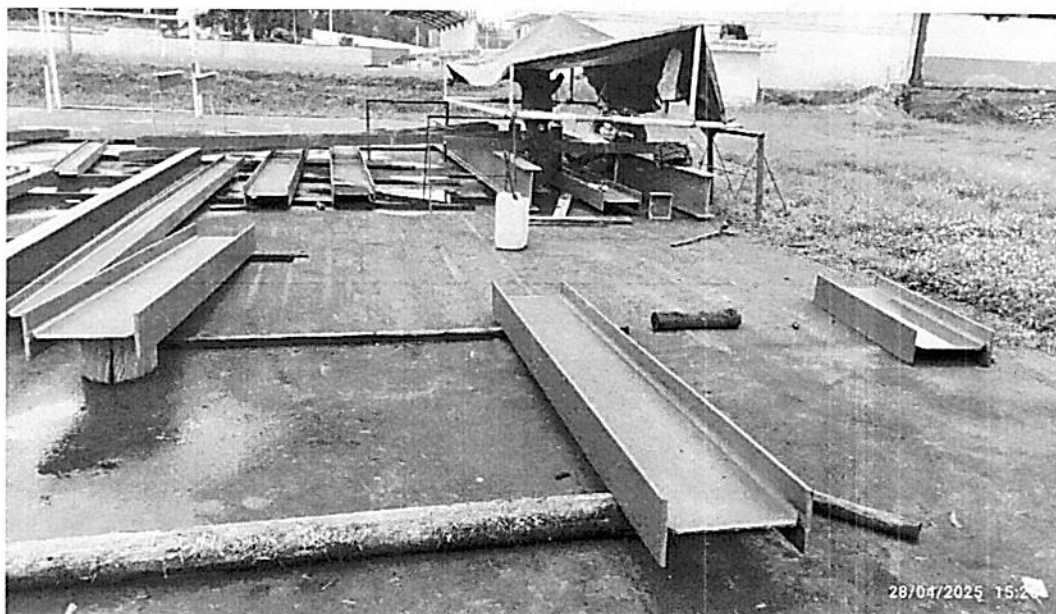


Ilustración 1 Corte y soldadura de vigas



Ilustración 2 Imprimación de vigas

Tabacundo, Calle Sucre 981
Parque Central

(02) 3836560

www.pedromoncayo.gob.ec





pm PEDRO MONCAYO
Cuna del Pueblo Cochasquí
ALCALDÍA 2023 - 2027

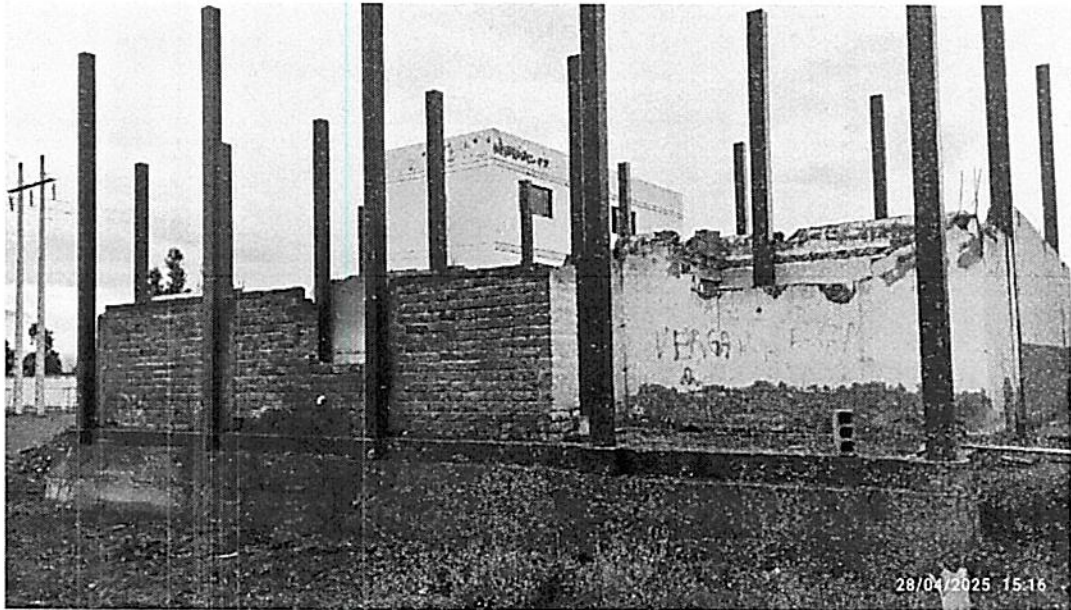


Ilustración 3 Colocación de columnas




Ilustración 4 Colocación de columnas

Tabacundo, Calle Sucre 981
Parque Central

(02) 3836560

www.pedromoncayo.gob.ec





pm PEDRO MONCAYO
Cuna del Pueblo Cochasquí
ALCALDÍA 2023 - 2027

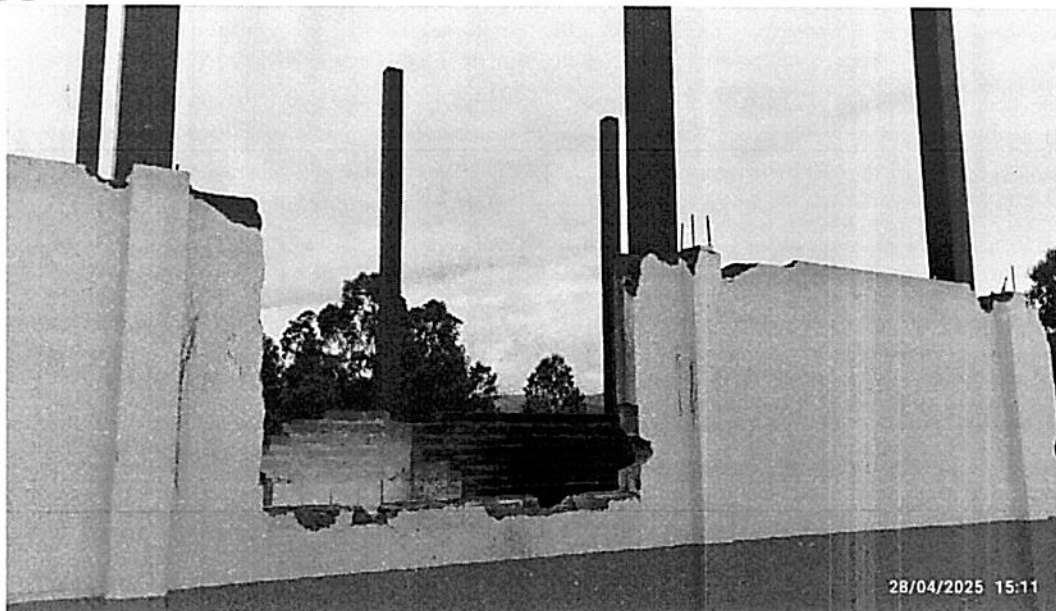



Ilustración 5 Colocación de columnas

CONCLUSIONES:

- El fiscalizador se pronunció que va estar en contacto con el maestro soldador a cargo para solventar cualquier inquietud del personal.
- La Dirección de Gestión de Planificación Territorial y Ordenamiento, se comprometió en hacer llegar los planos de la estructura de Cananvalle hacia la Unidad de Fiscalización para que puedan dar seguimiento a los trabajos a efectuarse por los maestros que se encuentran trabajando.
- Cualquier aspecto técnico de la estructura será solventado por la Dirección de Gestión de Planificación Territorial y Ordenamiento, la Dirección de Gestión de Obras Públicas realizara el nexos con el proveedor de los materiales de construcción hacer entregados hacia la comunidad de Cananvalle según lo estipulado en el Memorando Nro.697-DGP-GAD-MCPM-2024, de 12 de agosto de 2024 en donde se estipula el listado de materiales necesarios para realizar el mejoramiento de la cubierta de Cananvalle.

Particular que informo a usted para sus fines pertinentes.

Atentamente.


Ing. Alexander Lara A.
ANALISTA 1 DE INFRAESTRUCTURA CIVIL



Tabacundo, Calle Sucre 981
Parque Central

(02) 3836560

www.pedromoncayo.gob.ec

