



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Agua y Saneamiento Ambiental											
Proyecto	Gestión Integral de Residuos Sólidos.											
Descripción del proyecto	La Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Cantón Pedro Moncayo, incluyen la selección en la fuente de los desechos, recolección y su disposición, generando bioinsumos (abono).	Objetivo:					Gestionar los desechos generados en el cantón Pedro Moncayo bajo los lineamientos de la ambientales y normativa vigente en barrido, recolección y disposición final.					
	HITOS DEL PROYECTO											
Seguimiento	Para avance programático			Ejecución								
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance (☒)	Fecha logro					
	1. Construcción de los cubetos, II etapa	Planillas	50,00	Porcentaje	100	75						
	2. Tendido de energía eléctrica	Adjudicación	5,00	Contrato	1	0,6						
	3. Administración y Seguridad	Informes	5,00	Contrato	1	0,5	30 Febrero del 2017					
	4. Ejecución Plan de Manejo Ambiental	Monitoreo	15,00	Porcentaje	100	50						
	5. Dotación de Agua Potable	obra	10,00	Metros	2000	2000	30 Febrero 2017					
	6. Campaña Residuos Sólidos	Informes	15,00	Porcentaje	100	25						
	Avance financiero		Codificado									
			Inicial	Reforma		Ejecutado						
GAD PM		839.213,60	1.018.609,29		349.166,39							
Nivel de avance: 50.01%				Mes	Programático	Financiero						
<table style="margin: auto; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">Financiero</td> <td style="width: 100px; background-color: #4f81bd; height: 15px;"></td> <td style="text-align: right;">34,28</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Programático</td> <td style="width: 100px; background-color: #4f81bd; height: 15px;"></td> <td style="text-align: right;">64,25</td> </tr> </table>				Financiero		34,28	Programático		64,25	Enero	37,25	0
				Financiero		34,28						
				Programático		64,25						
				Febrero	45,75	0						
				Marzo	56,75	34,28						
				Abril	64,25	34,28						
				Mayo								
				Junio								
				Julio								
				Agosto								
				Septiembre								
				Octubre								
Noviembre												
Diciembre												

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	<u>Avances:</u> Se tiene un avance del 30% de Construcción de la II Etapa Relleno Sanitario Cantonal. Se están ejecutan los planes de comunicación, capacitación y monitoreo del PMA	Karen Hidalgo	31/01/2017
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica		
Febrero, 2017:	<u>Avances:</u> Actualmente se tiene un avance del 50% de Construcción de la II Etapa Relleno sanitario Cantonal. Se está ejecutan los planes de comunicación, capacitación y monitoreo del PMA	Karen Hidalgo	28/02/2017
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica		
Marzo 2017:	<u>Avances:</u> Se tiene un avance del 60% de Construcción de la II Etapa Relleno sanitario Cantonal. Se está ejecutan los planes de comunicación, capacitación y monitoreo del PMA. Los análisis de lixiviados realizados cumplen con los límites permisibles de la norma TULSMA.	Karen Hidalgo	31/03/2017
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u>		
Abril 2017:	<u>Avances:</u> Se ha ejecutado un avance del 75% de la II ETAPA DEL RELLENO SANITARIO, actualmente se está culminando con la colocación de geomembrana. Se tiene finalizado un 90% en construcción de cunetas perimetrales, y está en ejecución la instalación de la planta de tratamiento de lixiviados. Además se ejecutó el plan de ornamentación del Relleno Sanitario en concordancia al PMA sujeto en la Resolución Nro. 13	Karen Hidalgo	03/05/2017

Problemas y soluciones implemetadas: La etapa constructiva duró más tiempo de acordado en el contrato a razón de que en la excavación se encontró con perfiles de suelo de roca motivo por el cual se amplió el plazo de ejecución.

1. ELABORACIÓN DE ABONOS ORGANICOS.





2. OPERACIÓN RELLENO SANITARIO



3. CONSTRUCCIÓN II ETAPA.



ASUNTO: Reporte disposición final relleno sanitario.

OBJETIVO:


- Reportar la operación de la disposición final de desechos del mes de Marzo en base a la unidad de medida toneladas (Tn): **a)** dispuestas en el cubeto 1 y área de compostaje **b)** dispuestas por la recolección municipal y gestores autorizados **c)** por rutas y **d)** tiempos de operación **e)** peso desechos inorgánicos recuperados.

DESARROLLO:

En el mes de marzo se efectuó la operación de disposición final de acuerdo al siguiente resumen:

a)


TONELADAS	Enero	Febrero	Marzo
DISPUESTAS ÁREA DE COMPOSTAJE	0	0	0
DIPUESTAS CUBETO 1	430,61	410,84	450
TOTAL	410,84	450,00	450,00

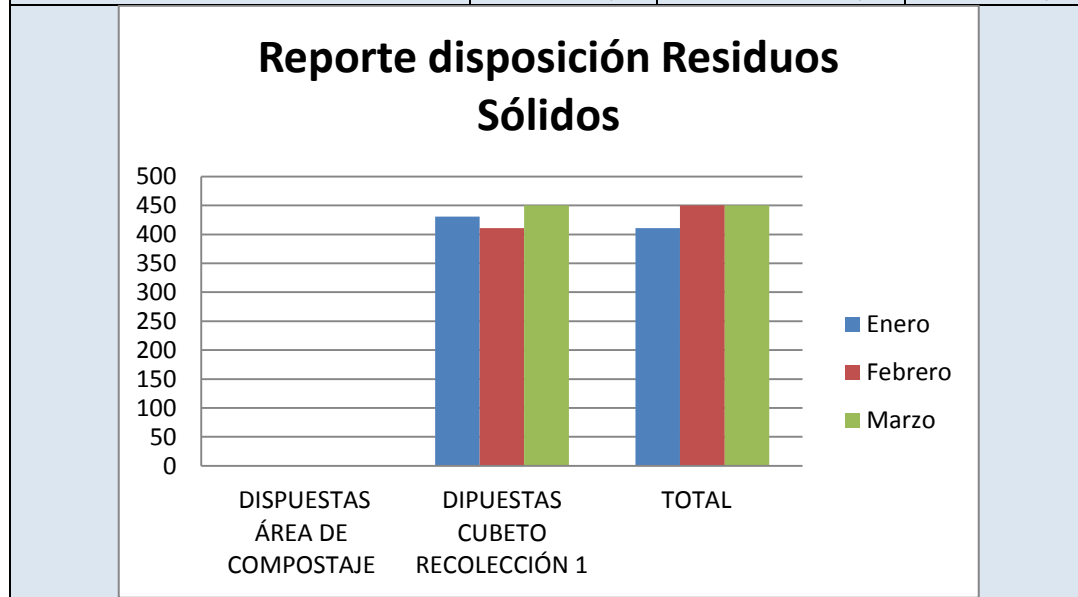

b)

TONELADAS	Diciembre	Enero	Febrero
DIPUESTAS GESTORES AUTORIZADOS	52,91	12,50	46,00
RECOLECCIÓN MUNICIPAL	430,61	410,84	450,00
TOTAL	483,52	423,34	496,00

c)

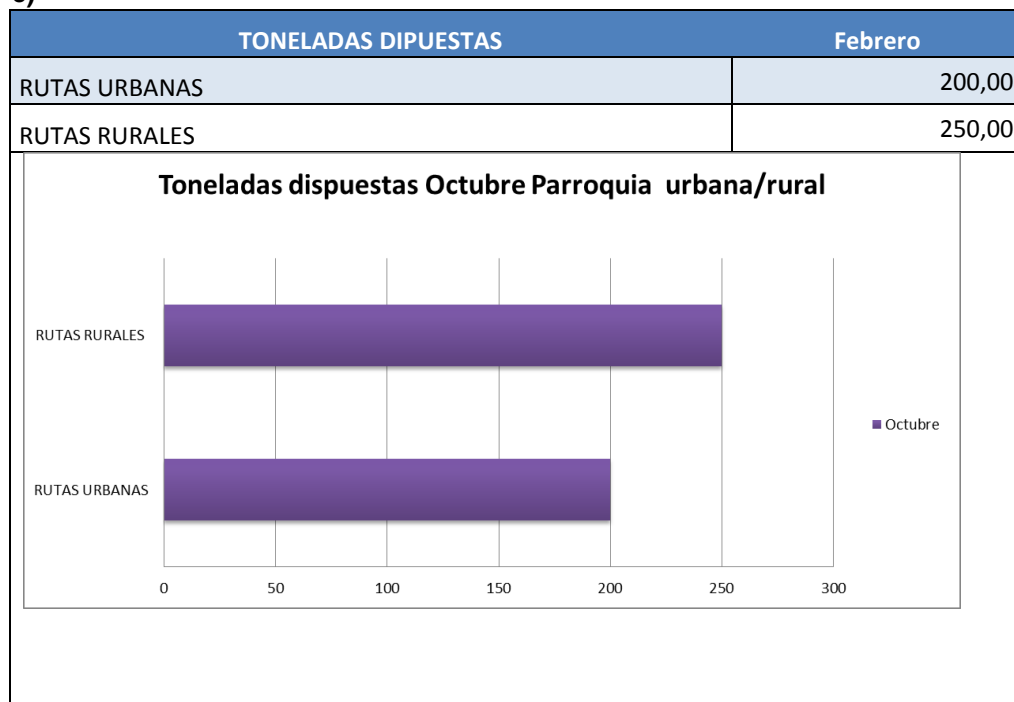

d)

PROMEDIO TIEMPOS	hora:min
------------------	----------

HORARIO DE LLEGADA	15:07
HORARIO DE SALIDA	15:22
DESCARGA	0:15

e)

VOLUMEN DE DESECHOS RECUPERADOS INORGANICOS (kg)								
CARTÓN DURO	CARTÓN SUAVE	MIXTO	PAPEL	PET	PLÁSTICO	POMAS	CHATARRA	TOTAL
952	-	39	41	39	27	84	97	1279
1745		155	150			179		2229
2697	0	194	191	39	27	263	97	3508

CONCLUSIÓN:

Desechos celdas de disposición final 496,00 Tn

Desechos tratados área de compostaje: 0 kg

Volúmenes de inorgánicos recuperados: 3017 kg
