




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2022



Proyecto del PDOT	Construcción del Alcantarillado Sanitario y de la Planta de Tratamiento Para El Barrio Chimbacalle, Sector La Loma y La Comunidad Tomalón 1 y Tomalón 2, Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro Moncayo		
Meta del PDOT	Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado.		
Programa del POA	Agua y Saneamiento		
Descripción y objetivo del proyecto	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento..		Objetivo:
			Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO								
	Para avance programático			Ejecución					
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro	
	1	Construcción del Alcantarillado Sanitario y de la Planta de Tratamiento Para El Barrio Chimbacalle, Sector La Loma y La Comunidad Tomalón 1 y Tomalón 2, Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro Moncayo	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	88,00	Porcentaje	100	98	x	31/07/2022
	2	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Informes	12,00	Unidad	12	7	x	31/07/2022
	Avance financiero		Codificado						
		Inicial	Reforma		Ejecutado				
GAD MPM		\$	40.000,00		-			\$	

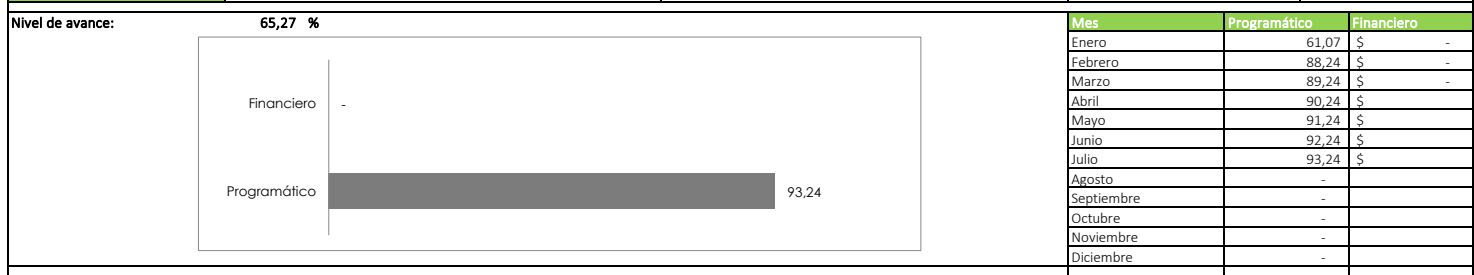

		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2022:	Avances: Se cuenta con un avance de 98% Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/01/2022
Febrero, 2022:	Avances: Se mantiene el mismo porcentaje del mes anterior Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	28/02/2022
Marzo, 2022:	Avances: Se mantiene el mismo porcentaje Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/03/2022
Abril, 2022:	Avances: Se mantiene el mismo porcentaje del mes anterior Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Julia Amendaño Analista 1 de Vialidad	30/04/2022
Mayo, 2022:	Avances: Se mantiene el mismo porcentaje del mes anterior Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Julia Amendaño Analista 1 de Vialidad	31/05/2022
Junio, 2022:	Avances: Se mantiene el mismo porcentaje del mes anterior Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Julia Amendaño Analista 1 de Vialidad	30/06/2022
Julio, 2022:	Avances: Se mantiene el mismo porcentaje del mes anterior Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Julia Amendaño Analista 1 de Vialidad	31/07/2022
