



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2022



Proyecto del PDOT: Construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas de la Cabecera Cantonal Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha


Meta del PDOT: Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado

Programa del POA: Agua y Saneamiento

Descripción y objetivo del proyecto: En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento..

Objetivo: Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias.
Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual

Seguimiento					HITOS DEL PROYECTO				
Para avance programático					Ejecución				
Detalle		Medio de verificación		Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
1	Construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas de la Cabecera Cantonal Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional		88,00	Porcentaje	100	98	x	31/03/2022
2	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Informes		12,00	Unidad	12	3	x	31/03/2022
Avance financiero				Codificado					
				Inicial	Reforma			Ejecutado	
GAD MPM				\$	310.124,58			\$ -	

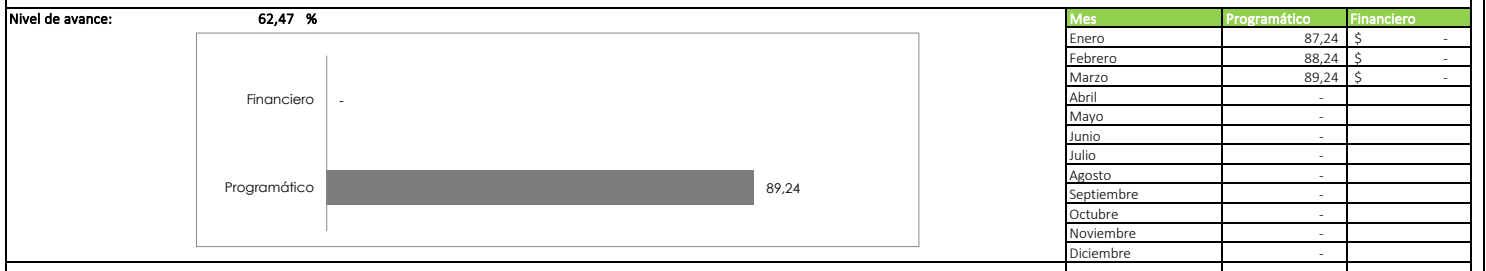

		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2022:	<p>Avances: Se cuenta con un avance de 80%</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: No aplica</p>	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/01/2022
Febrero, 2022:	<p>Avances: Se mantiene el mismo avance que el mes anterior</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: No aplica</p>	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	28/02/2022
Marzo, 2022:	<p>Avances: Se mantiene el mismo avance que el mes anterior</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: No aplica</p>	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/03/2022
