



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2022



Proyecto del PDOT: Construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas de la Cabecera Cantonal Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha


Meta del PDOT: Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado

Programa del POA: Agua y Saneamiento

Descripción y objetivo del proyecto: En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento..

Objetivo: Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias.
Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual

Seguimiento				
HITOS DEL PROYECTO				
Para avance programático			Ejecución	
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta
1	Construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas de la Cabecera Cantonal Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha	88,00	Porcentaje	100
2	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	12,00	Unidad	12
			Avance	98
			(X)	x
				Fecha logro
				30/04/2022
				30/04/2022
Avance financiero		Codificado		
		Inicial	Reforma	Ejecutado
GAD MPM		\$	310.124,58	-
				\$
				-

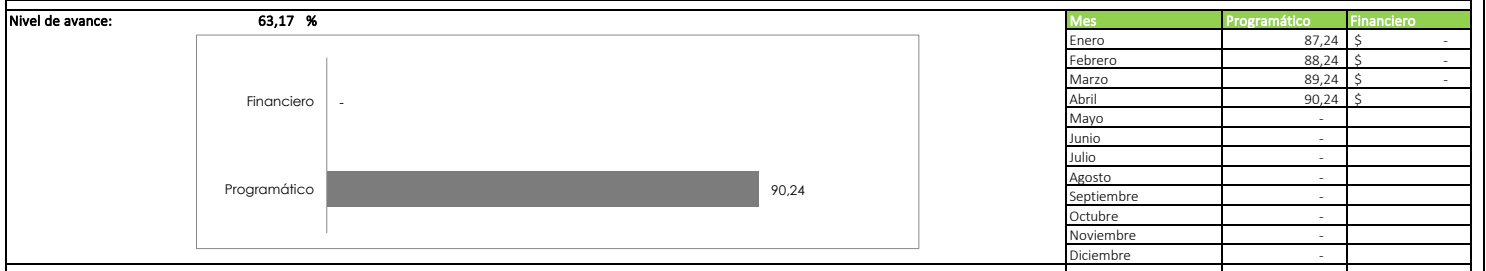

	Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2022:	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/01/2022
<p><u>Avances:</u> Se cuenta con un avance de 80%</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica</p>		
Febrero, 2022:	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	28/02/2022
<p><u>Avances:</u> Se mantiene el mismo avance que el mes anterior</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica</p>		
Marzo, 2022:	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/03/2022
<p><u>Avances:</u> Se mantiene el mismo avance que el mes anterior</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica</p>		
Abril, 2022:	Ing. Julia Amendaño Analista 1 de Vialidad	30/04/2022
<p><u>Avances:</u> Se mantiene el mismo avance que el mes anterior</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica</p>		
