


FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Calidad Ambiental
Proyecto	Sistema de Regularización y Control Ambiental en el Cantón Pedro Moncayo.
Descripción del proyecto	Se realizará el control ambiental a las actividades económicas del cantón mediante inspecciones in situ, se regularizará ambientalmente (obtención de permisos ambientales y auditorías ambientales) los proyectos institucionales en los entes competentes. Mediante la acreditación de Autoridad ambiental en lo referente a la actividad de áridos y pétreos se realizará el control y regularización ambiental a fin de que desarrollen sus actividades en cumplimiento de la normativa ambiental.
	Objetivos
	1. Realizar el control ambiental de las actividades económicas del Cantón.
	2. Obtener los Permisos Ambientales de los proyectos institucionales.
	3. Realizar las Auditorías Ambientales de cumplimiento de los permisos obtenidos.
4. Control y regularización ambiental de las actividades mineras del cantón.	

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO							
	Para avance programático			Ejecución				
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
	1. Generar material publicitario que fomente la conservación del patrimonio natural en el cantón Pedro Moncayo (afiches, trípticos, entre otros).	Acta entrega recepción	5,00	factura	2	2	x	20/08/2018
	2. Realizar el mantenimiento a la infraestructura existente (Complejo Lacustre Mojanda).	Acta entrega recepción	5,00	factura	2	2	x	26/09/2018
	3. adquisición de tractor cortador de césped y cortasetos, para la municipalidad.	Acta entrega recepción	5,00	factura, acta de entrega	2	1		
	4. Adquirir al menos cinco motocicletas para la movilización de los guardabosques que realizarán el control y vigilancia del área protegida.	Acta entrega recepción	10,00	documento	3	3	x	27/09/2018
	5. Contratación de la consultoría para determinar la tenencia de tierras en la Zona Lacustre Mojanda.	Contrato Seguimiento y Evaluación	20,00	documento	3	3	x	06/04/2018
	6. Contratación de la consultoría para realizar las alternativas de Manejo del ACUS Mojanda.	Contrato Seguimiento y Evaluación	-	documento	3			
	7. contratación de servicio de esterilización de perros en el cantón Pedro Moncayo	registros, fotografías	5,00	factura	2	0		
	8. contratación de servicio de plantaciones forestales	acta de entrega	5,00	acta de entrega	2	1		
	9. Adquisición de plantas ornamentales para parques del cantón	acta de entrega	10,00	factura	2	2	x	01/10/2018
	10. Adquisición de un remolque canino para la municipalidad	acta de entrega	5,00	factura	2	2	x	10/06/2018
	11. Contratación de servicio de mantenimiento para motoguadañas y motosierra de la municipalidad	acta de entrega	5,00	factura	2	1		
	12. Adquisición de dos motoguadañas para la municipalidad	acta de entrega	5,00	factura	2	2	x	10/05/2018
13. Adquisición de materiales para cercar quebradas públicas en el cantón	acta de entrega	5,00	factura	2	1			
14. Coordinación para atención de requerimientos de la ciudadanía del cantón.	fotografías, visitas in situ	10,00	fotografías, registro	100	95		28/09/2018	
15. Contratar al personal técnico y operativo necesario para la ejecución del presente proyecto.	Avance del Proyecto	5,00	Informes documentos	12	11		28/09/2018	
Avance financiero			Codificado					
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado			
			99.000,00	-	87.106,00			

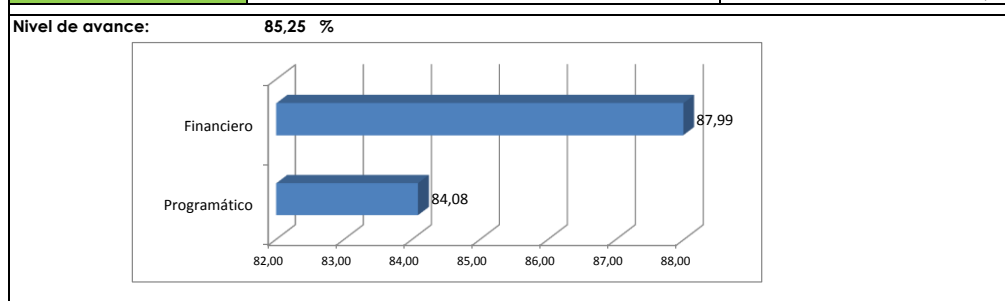

Mes	Programático	Financiero
Enero	0,96	-
Febrero	6,39	-
Marzo	11,04	-
Abril	35,97	-
Mayo	39,72	-
Junio	42,36	-
Julio	48,82	-
Agosto	61,60	-
Septiembre	72,65	-
Octubre	84,08	-
Noviembre	-	-
Diciembre	-	-

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	Avances: 1) En el contexto de la declaratoria del ACUS Mojanda, se encuentran en desarrollo los trabajos de la consultoría que determinará la tenencia de la tierra en la Zona Lacustre Mojanda. 2) En vista de que las motoguadañas de la municipalidad, han cumplido con su vida útil, se gestionó la adquisición de dos motoguadañas, mismas que servirán para realizar el mantenimiento de los parques y espacio verdes del cantón.	Eduardo Cualchi Técnico de Patrimonio Natural Geovany Rivera Técnico de Apoyo	31/01/2018
	Problemas y soluciones implementadas: Se registraron inconvenientes al momento de obtener los documentos de ingreso de los bienes a la institución, por lo que se aplazó el registro de la factura, para el mes de febrero.		
Febrero, 2018:	Avances: 1) En el contexto de la declaratoria del ACUS Mojanda, se encuentran en desarrollo los trabajos de la consultoría que determinará la tenencia de la tierra en la Zona Lacustre Mojanda. 2) En vista de que las motoguadañas de la municipalidad, han cumplido con su vida útil, se gestionó la adquisición de dos motoguadañas, mismas que servirán para realizar el mantenimiento de los parques y espacio verdes del cantón. 3) En el presente mes se realizó la gestión necesaria para la adquisición, del remolque canino mismo que servirá para la	Eduardo Cualchi Técnico de Patrimonio Natural Geovany Rivera Técnico de Apoyo	28/02/2018
	Problemas y soluciones implementadas: Se registraron inconvenientes al momento de obtener los documentos de ingreso de los bienes a la institución, por lo que se aplazó el registro de la factura, para el mes de marzo		

Marzo, 2018:	<u>Avances:</u> 1) En el contexto de la declaratoria del ACUS Majada, se encuentran en desarrollo los trabajos de la consultoría que determinará la tenencia de la tierra en la Zona Lacustre Mojanda. 2) Se ha realizado el proceso de adquisición de dos motoguadañas para la municipalidad, en este proceso falta se realice el pago al proveedor 3) En el presente mes se realizó la gestión necesaria para la adquisición del remolque canino mismo que servirá para la	Eduardo Cualchi Técnico de Patrimonio Natural Geovany Rivera Técnico de Apoyo	31/03/2018
<u>Problemas y soluciones implementadas:</u>			
Abril, 2018:	<u>Avances:</u> 1) la determinación de la tenencia de tierras en las Zona Lacustre de Mojanda, al momento ha finalizado por parte de la consultoría.	Eduardo Cualchi Técnico de Patrimonio Natural Geovany Rivera Técnico de Apoyo	30/04/2018
<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Se registraron inconvenientes al momento de obtener los documentos de ingreso de los bienes a la institución, por lo que la actividad de adquisición del remolque se postergo al mes de mayo.			
Mayo, 2018:	<u>Avances:</u> 1) la determinación de la tenencia de tierras en las Zona Lacustre de Mojanda, al momento ha finalizado por parte de la consultoría, se ha realizado el proceso de adquisición del remolque canino, la documentación del mismo se encuentra en proceso de pago al proveedor, y también se realizó el evento por el día del ambiente.	Eduardo Cualchi Técnico de Patrimonio Natural Geovany Rivera Técnico de Apoyo	31/05/2018
<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica			
Junio, 2018:	<u>Avances:</u> 1) las actividades se han avanzado de acuerdo al cronograma establecido, existen actividades correspondientes al tercer trimestre que estamos iniciando.	Eduardo Cualchi Técnico de Patrimonio Natural Geovany Rivera Técnico de Apoyo	30/06/2018
<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica			
Julio, 2018:	<u>Avances:</u> 1) las actividades se han avanzado de acuerdo al cronograma establecido, existen actividades correspondientes al tercer trimestre que estamos iniciando.	Eduardo Cualchi Técnico de Patrimonio Natural Geovany Rivera Técnico de Apoyo	31/07/2018
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica			
agosto, 2018:	<u>Avances:</u> 1) las actividades se han avanzado de acuerdo al cronograma establecido, existen actividades correspondientes al tercer trimestre que estamos iniciando.	Eduardo Cualchi Técnico de Patrimonio Natural Geovany Rivera Técnico de Apoyo	30/08/2018
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica			
Septiembre, 2018:	<u>Avances:</u> 1) las actividades se han avanzado de acuerdo al cronograma establecido, existen actividades correspondientes al tercer trimestre que estamos iniciando.	Eduardo Cualchi Técnico de Patrimonio Natural Geovany Rivera Técnico de Apoyo	30/09/2018
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica			
Octubre, 2018:	<u>Avances:</u> 1) las actividades se han avanzado de acuerdo al cronograma establecido, estamos realizando las actividades de adquisición de materiales para cercar quebradas publicas del canton, también se realizando la contratación del servicio de mantenimiento de los equipos (motoguadañas y motosierra), también estamos realizando la adquisición un tractor cortador de cesped y un cortasetos para la municipalidad.	Eduardo Cualchi Técnico de Patrimonio Natural Geovany Rivera Técnico de Apoyo	31/10/2018
<u>observaciones:</u> en relacion al avance del mes anterior, en este mes existe un disminucion del porcentaje, a razon que se crearon nuevas actividades que estamos iniciando esos procesos.			
